

Groot onderhoud verharding N223 Hoeksebaan

Vanavond bespreken we...



- Waarom zijn we hier?
- Uitleg over het project.
- Fasering: 15 > 9 weken.
- Omleidingsroutes voor doorgaand verkeer
- Getroffen maatregelen om hinder te beperken
- Mogelijke beheersmaatregelen tijdens projectuitvoer
- Omleidingsroutes voor bestemmingsverkeer langs het werkvak

Waarom zijn we hier?




- Gebrekkige communicatie
- Bedrijven en bewoners te laat geïnformeerd
- Te veel focus op cijfers en data
- Keuze gemaakt te informeren na afronding plan
- Goed plan, slechte communicatie

N223 Hoeksebaan



Locaties

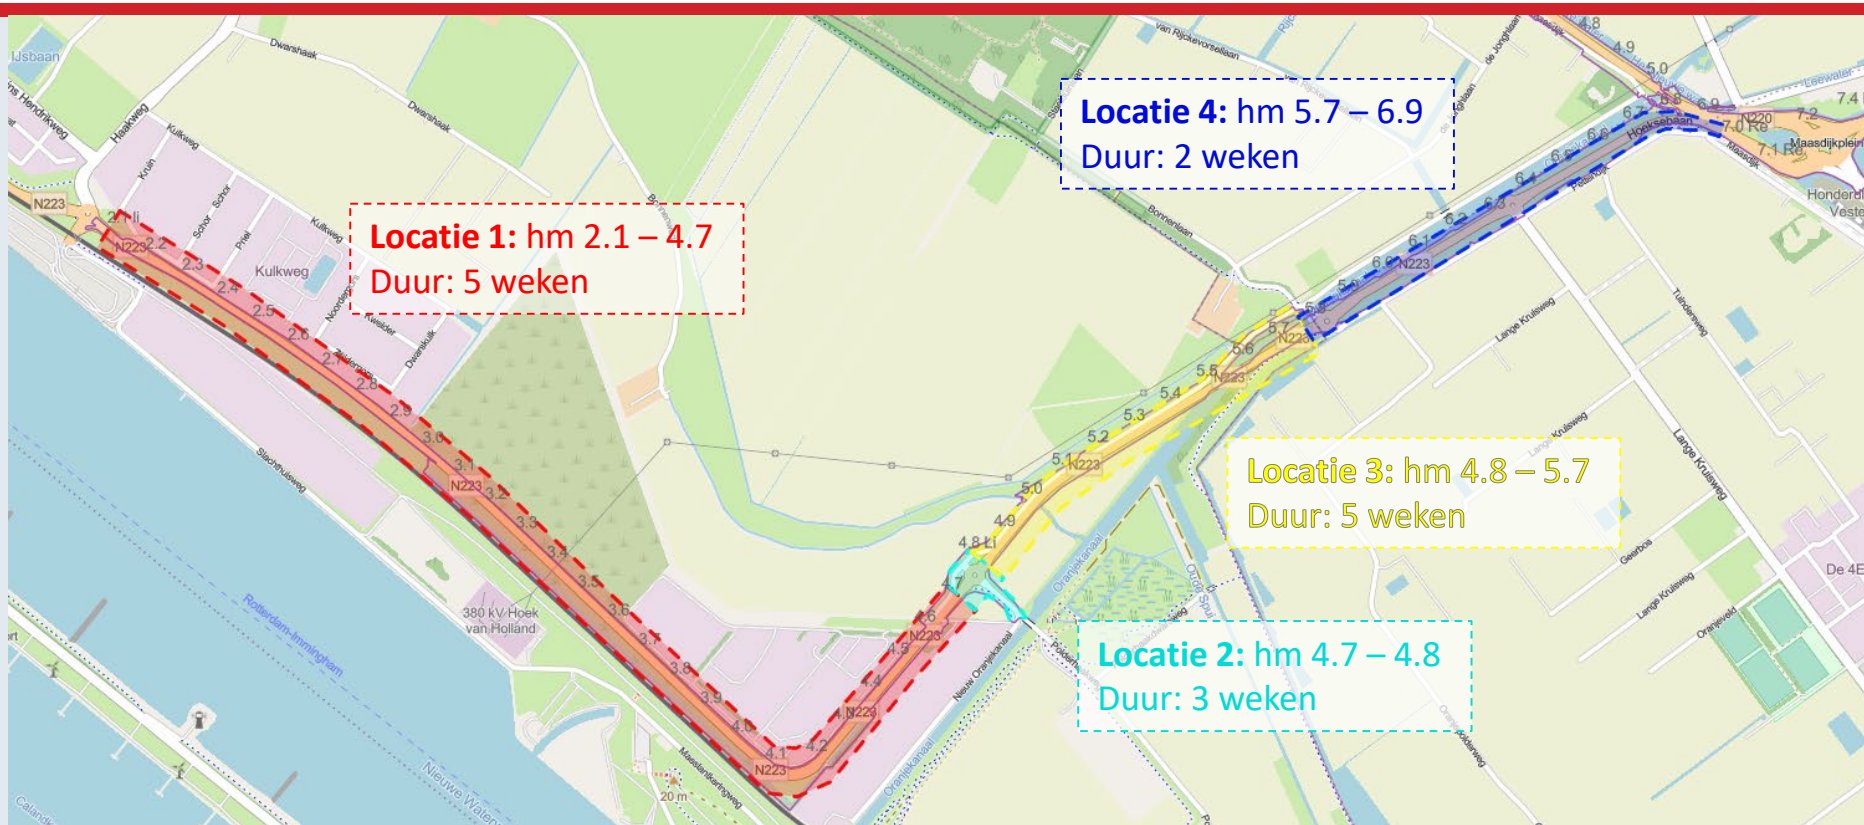


Totaal 15 weken werk...

- ... dat we door goede fasering terug brengen tot 9 weken.
- N223 is oorspronkelijk te licht aangelegd
- Over (bijna) het gehele traject gaan we de fundering verstevigen
- een asfaltpakket van 205 mm bestaande uit vier lagen
- Zo houden we de restlevensduur relatief gelijk

		Aanbrengen (mm)					Fundering vervangen
Hm van	Hm tot	DL	TL	OL	OL	TOTAAL	
2.1	3.0	30	50	60	65	205	Ja
3.0	3.6	30	50	60	65	205	Ja
3.6	4.7	30	50	60	65	205	Ja
4.7	5.8	30	50	60	65	205	Ja
5.8	6.9	30	60			90	Nee


Fase 1

Planning: ma 17 maart t/m zo 23 maart 2025

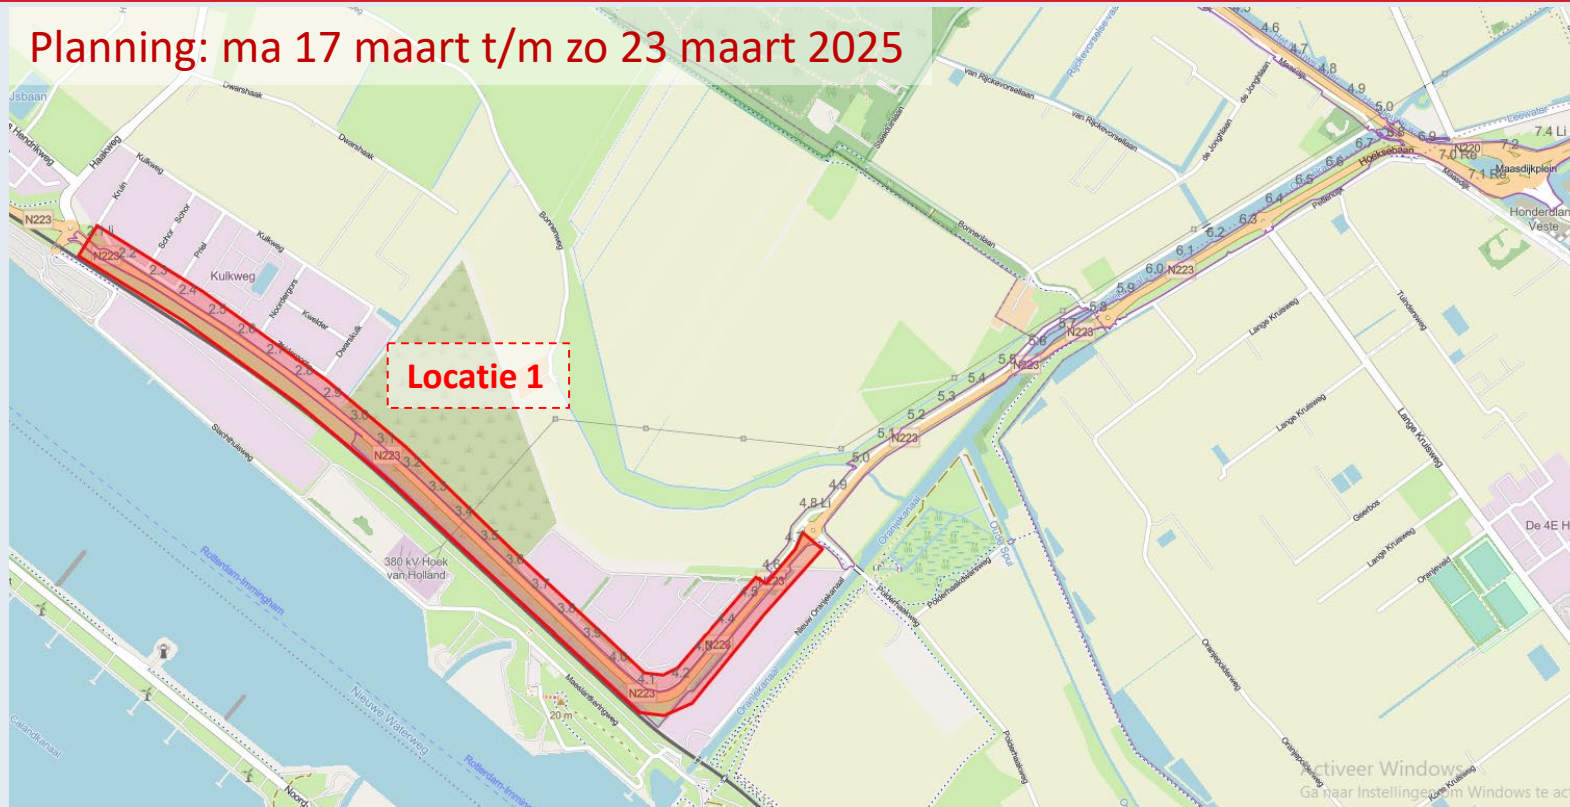


Fase 2

Planning: ma 24 maart t/m ma 21 april 2025

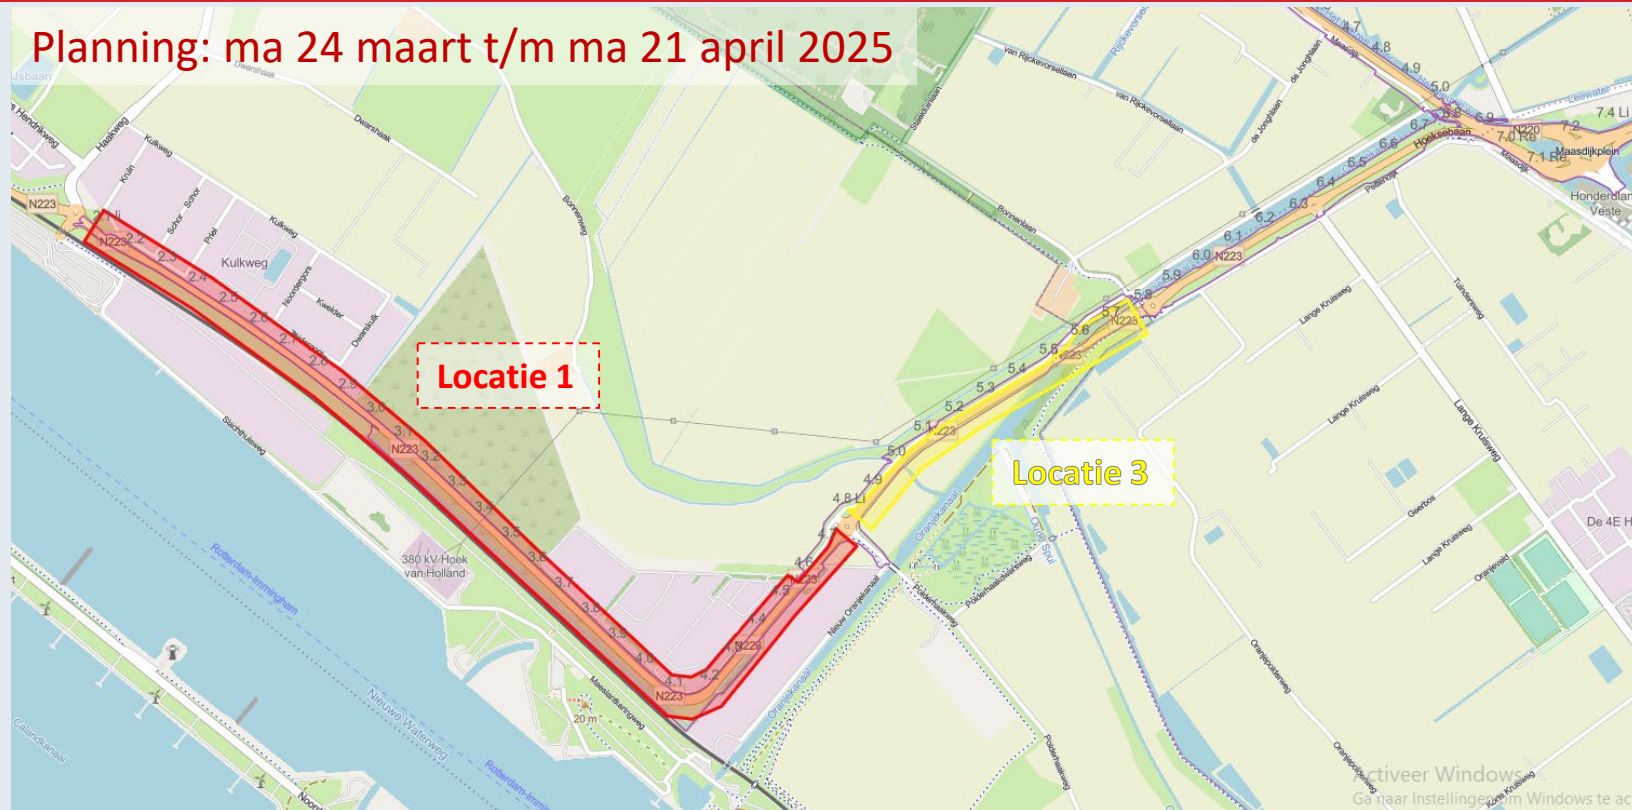

Fase 3


Planning: di 22 april t/m zo 27 april 2025

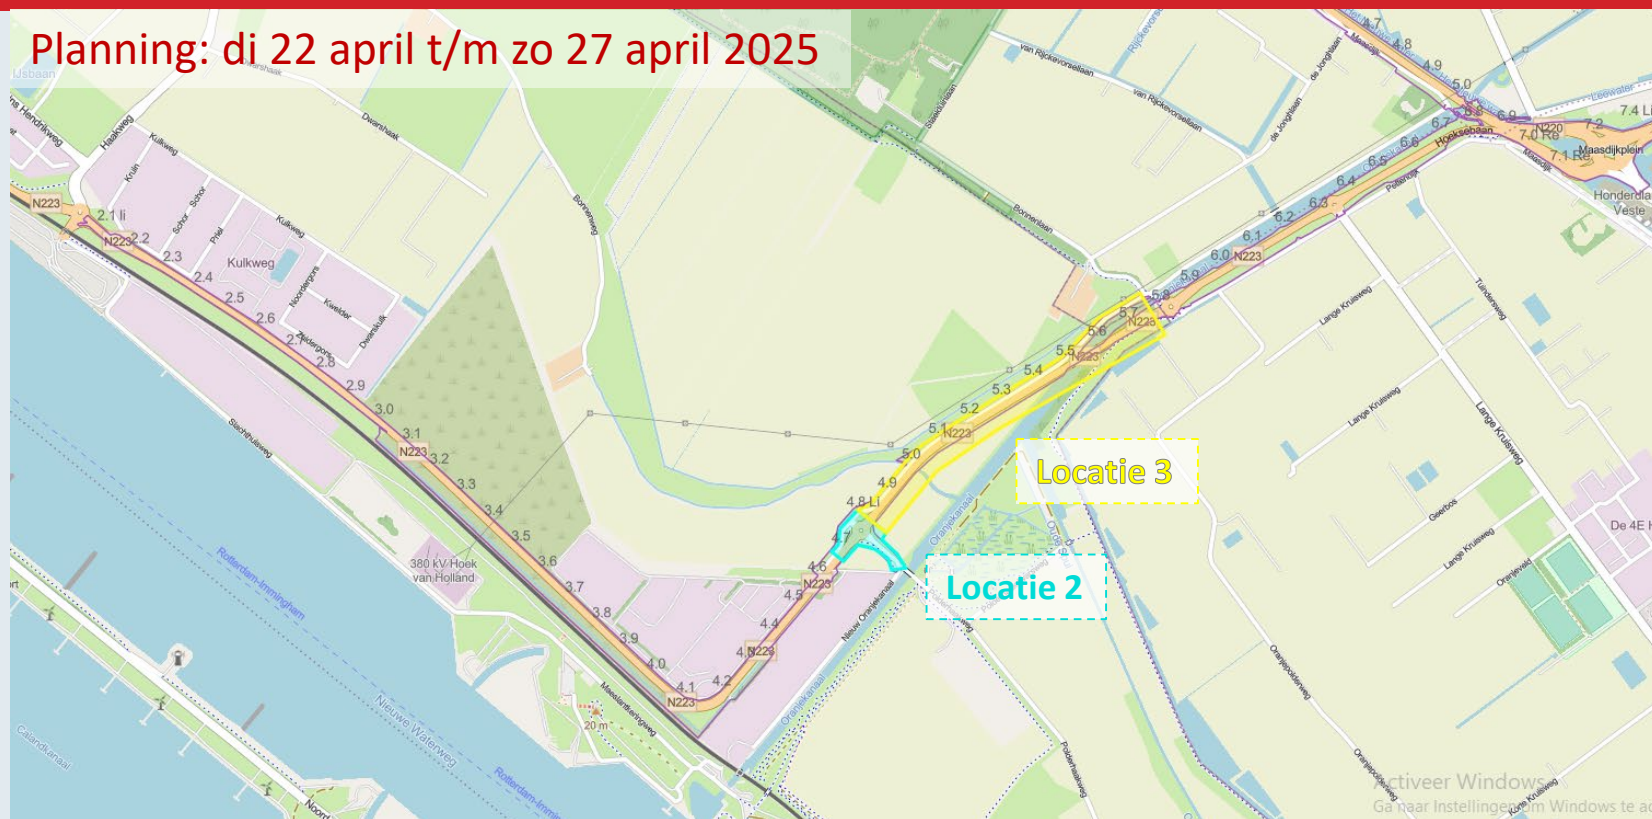

Fase 4a




Planning: ma 28 april t/m ma 5 mei 2025

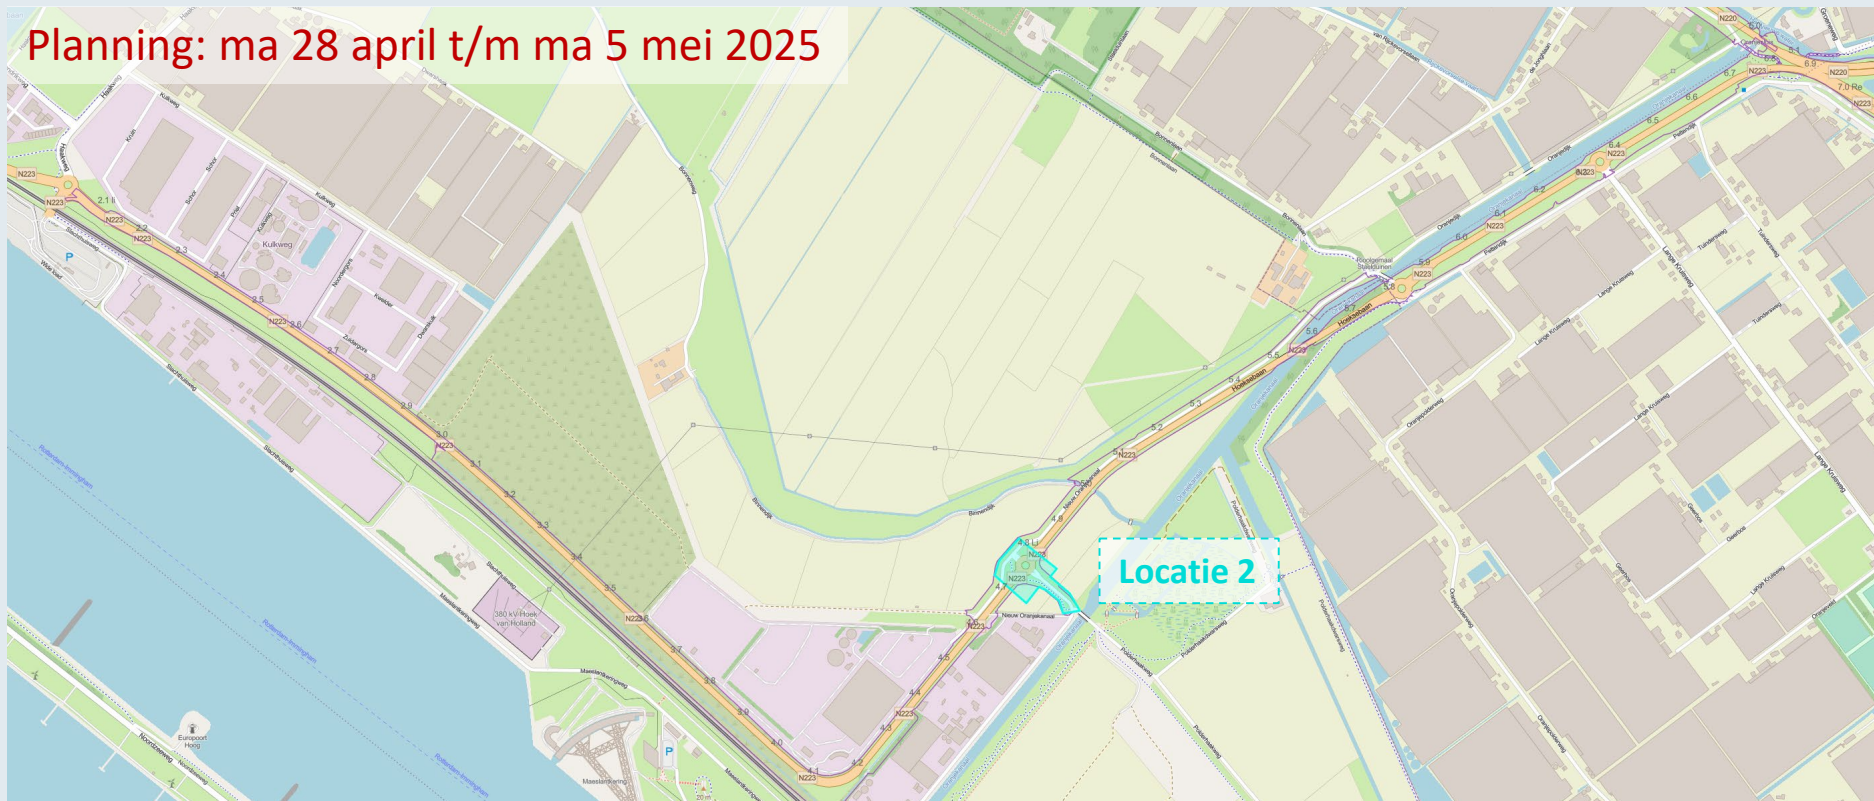

Fase 4b

Planning: di 6 mei t/m di 13 mei 2025

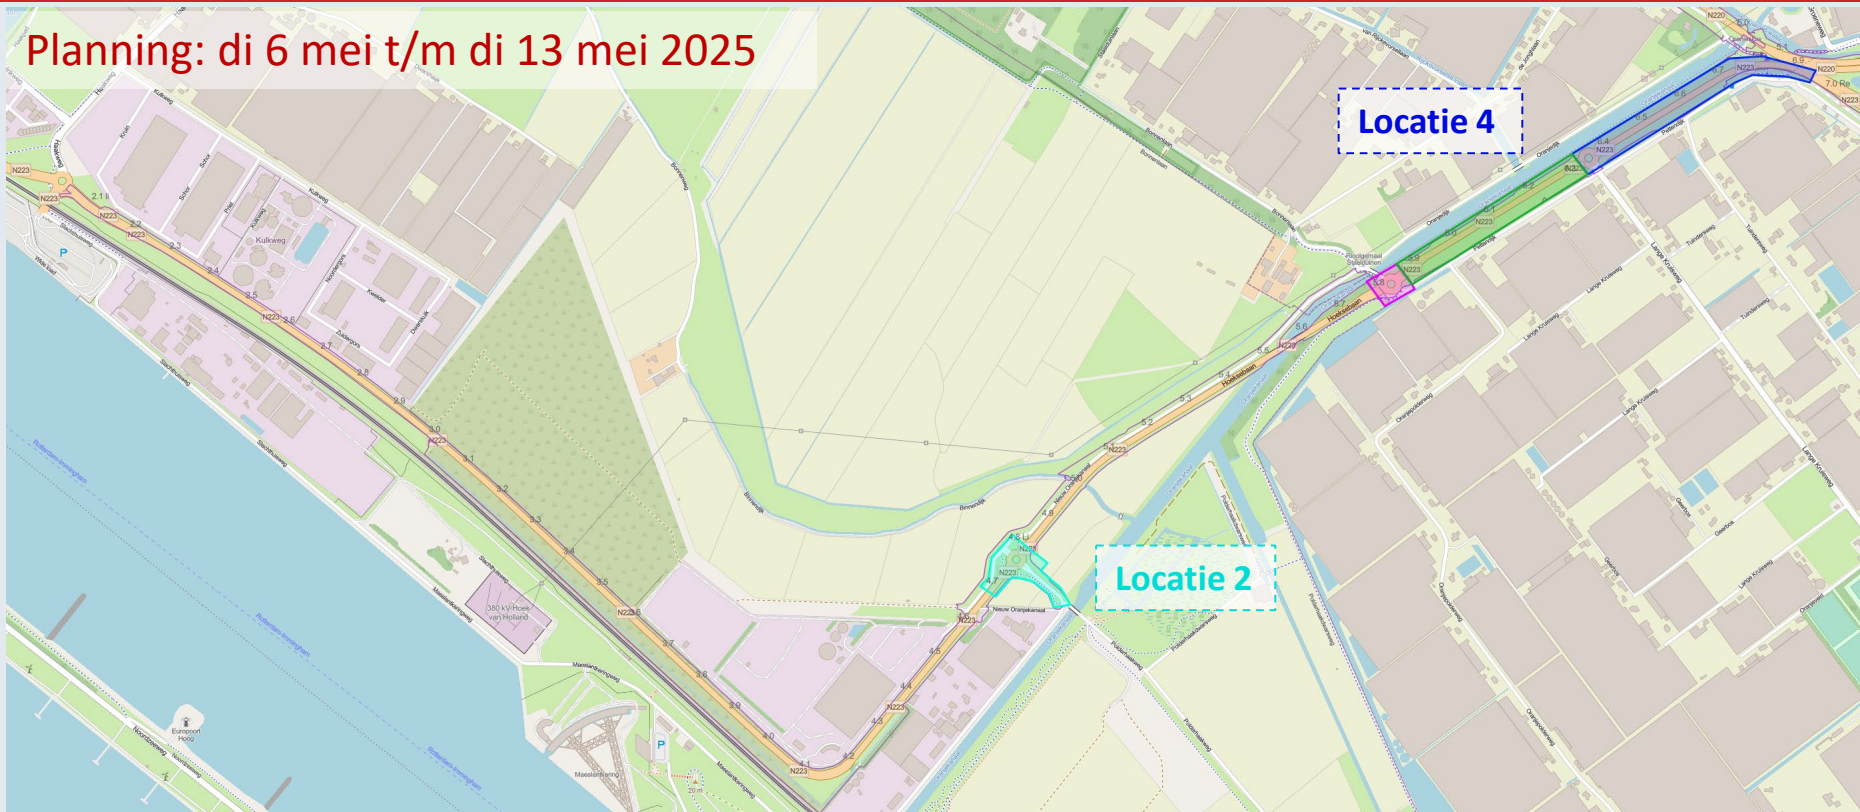

Fase 5

Planning: wo 14 mei t/m di 20 mei 2025



Omleidingen voor doorgaand verkeer



Maatregelen om hinder te beperken



- Door gefaseerd te werken, verkorten we de uitvoeringsperiode van 15 naar 9 weken ...
- ... en houden we alle bedrijven te allen tijde bereikbaar
- We maken lange dagen (van ~6:00 tot ~18:00)
- De planning is strak ingesteld om **voor het strandseizoen** (opening donderdag 29 mei) klaar te zijn
- We scheiden het verkeer vanuit Stena Line. Vrachtverkeer gaat over de Haakweg en de N220, passagiers in auto over de N211 en N220.

Hoe sturen we bij tijdens de uitvoeringsperiode?

- We monitoren verkeersdrukke op afstand en passen verkeerslichten aan om bij te sturen.
- We zetten op verschillende plekken verkeersregelaars in, hierin valt ook te schakelen.
- We attenderen bedrijven binnen de clusters wanneer de omleidingsroutes voor hen wijzigen.
- We communiceren via de projectenpagina online en plaatsen hier updates: [N223 Werkzaamheden](#)



Omleidingsroute Cluster Kulkweg



- Omleidingsroute gedurende gehele uitvoer gelijk

Omleidingsroute Cluster Slachthuisweg/Maeslantkering



- Omleidingsroute gedurende gehele uitvoer gelijk
- Rotonde blijft te allen tijde open

Omleidingsroutes Cluster De Jonghlaan




- Verschillende omleidingen afhankelijk van fase
- Hier Fase 1, 2 & 3: Van **17 maart tot en met 27 april**

Omleidingsroutes Cluster De Jonghlaan



- Verschillende omleidingen afhankelijk van fase
- Hier Fase 4 & 5: Van **28 april tot en met 25 mei**

Omleidingsroutes Cluster Lange Kruisweg

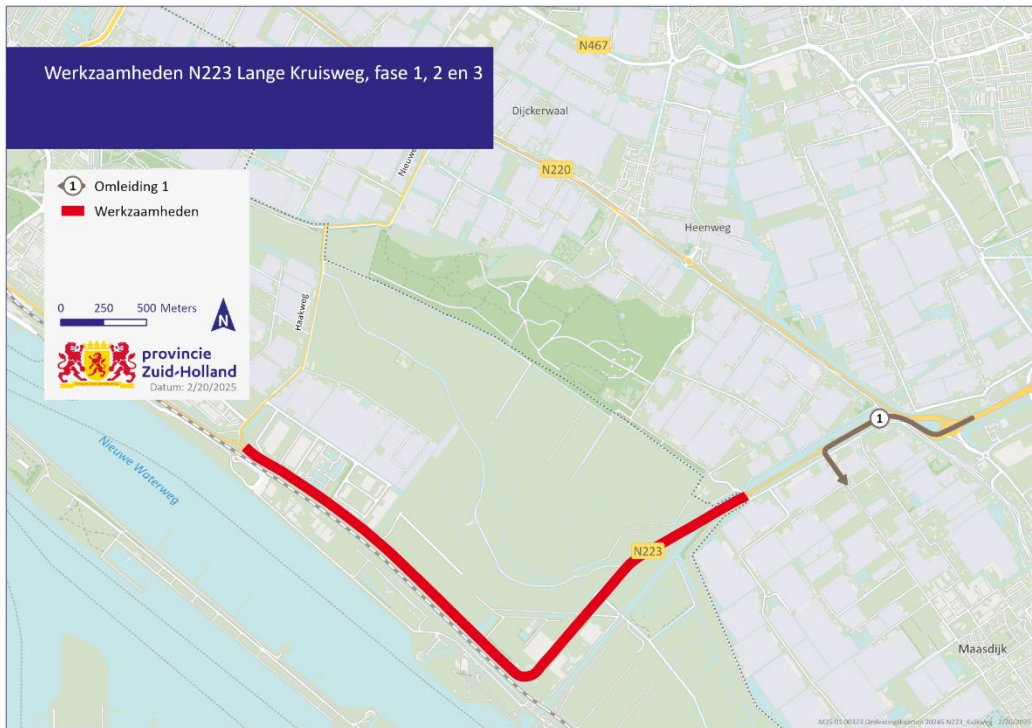

- Verschillende omleidingen afhankelijk van fase
- Hier Fase 1, 2 & 3: Van **17 maart tot en met 28 april**

Omleidingsroutes Cluster Lange Kruisweg



- Verschillende omleidingen afhankelijk van fase
- Hier Fase 4 & 5: Van **28 april tot en met 25 mei**

Omleidingsroutes Cluster Nieuw Oranjekanaal



- Verschillende omleidingen afhankelijk van fase
- Hier Fase 1: Van **17 maart tot en met 23 maart**

Omleidingsroutes Cluster Nieuw Oranjekanaal



- Verschillende omleidingen afhankelijk van fase
- Hier Fase 2: Van **24 maart tot en met 21 april**

Omleidingsroutes Cluster Nieuw Oranjekanaal



- Verschillende omleidingen afhankelijk van fase
- Hier Fase 3: Van **22 april tot en met 27 april**

Omleidingsroutes Cluster Nieuw Oranjekanaal



- Verschillende omleidingen afhankelijk van fase
- Hier Fase 4 & 5: Van **28 april tot en met 25 mei**

Omleidingsroutes Fase 4b



- Verschillende omleidingen afhankelijk van fase
- Hier Fase 4b: Van **6 mei tot en met 13 mei**

Omleidingsroutes Fase 5



Verschillende omleidingen
afhankelijk van fase
Hier Fase 5: Van **14 mei tot en
met 20 mei**
